

虎尾科大 物料暫置及吊掛動線計畫 機械、教三、教四

---111/11/03版---

機械館施工動線管制-吊掛、物料暫置(平面圖)

工程進場時間會進行吊掛作業，會有大型吊車，我司會實施交管作業與施工區域封鎖管制，預計動線如圖示。


預計吊掛次數8-10次，約3H/次。

時間排程

11/11/AM10:00
模組進料放置物料暫置區


11/12/AM08:00
吊掛作業開始
模組優先吊掛

11/12/AM10:00
鋼構材料及部分機電
材料進場卸貨

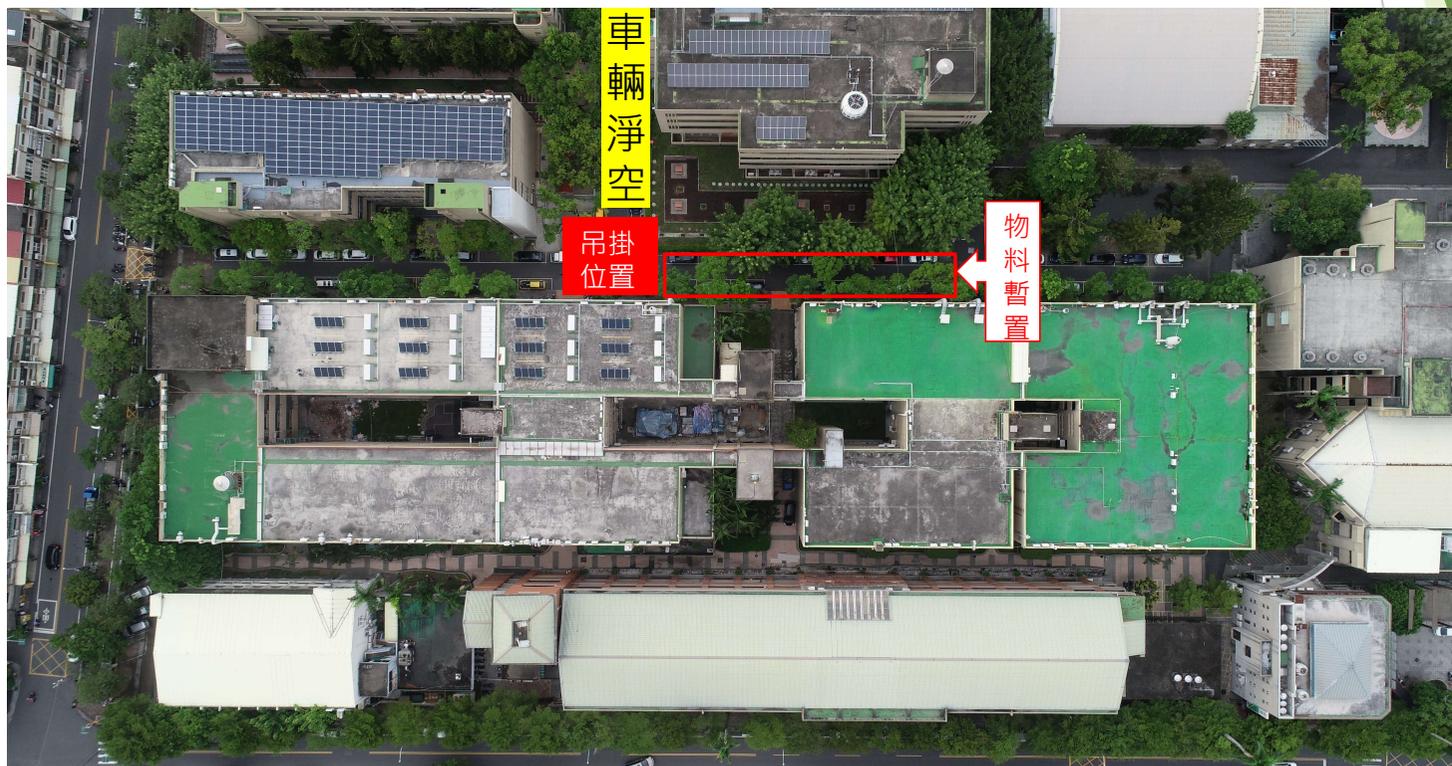

中租迪和股份有限公司
Chailase Finance Co., Ltd.

機械館施工動線管制-吊掛、物料暫置(停車格淨空區域及時間)

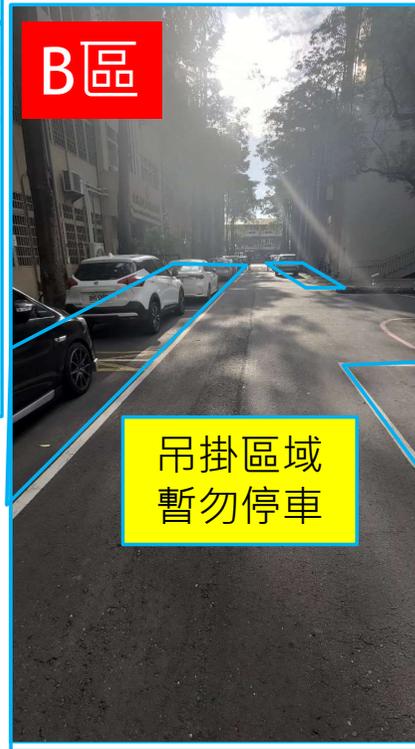

停車格暫勿停放時間

A區：
11/12 (全天)

B區：
11/12 (全天)

C區：
11/11-11/12 (全天)

教三、教四館施工動線管制-吊掛、物料暫置(平面圖)

工程進場時間會進行吊掛作業，會有大型吊車，我司會實施交管作業與施工區域封鎖管制，預計動線如圖示。

預計吊掛次數8-10次，約3H/次。

時間排程

11/12/AM10:00
模組進料放置物料暫置區

11/13/AM08:00
吊掛作業開始
模組優先吊掛

11/13/AM10:00
鋼構材料及部分機電
材料進場卸貨



4
中租迪和股份有限公司
Chailase Finance Co., Ltd.

